




## Nyt regnvandssystem i Rønnevang Erhvervsområde - Delprojekter

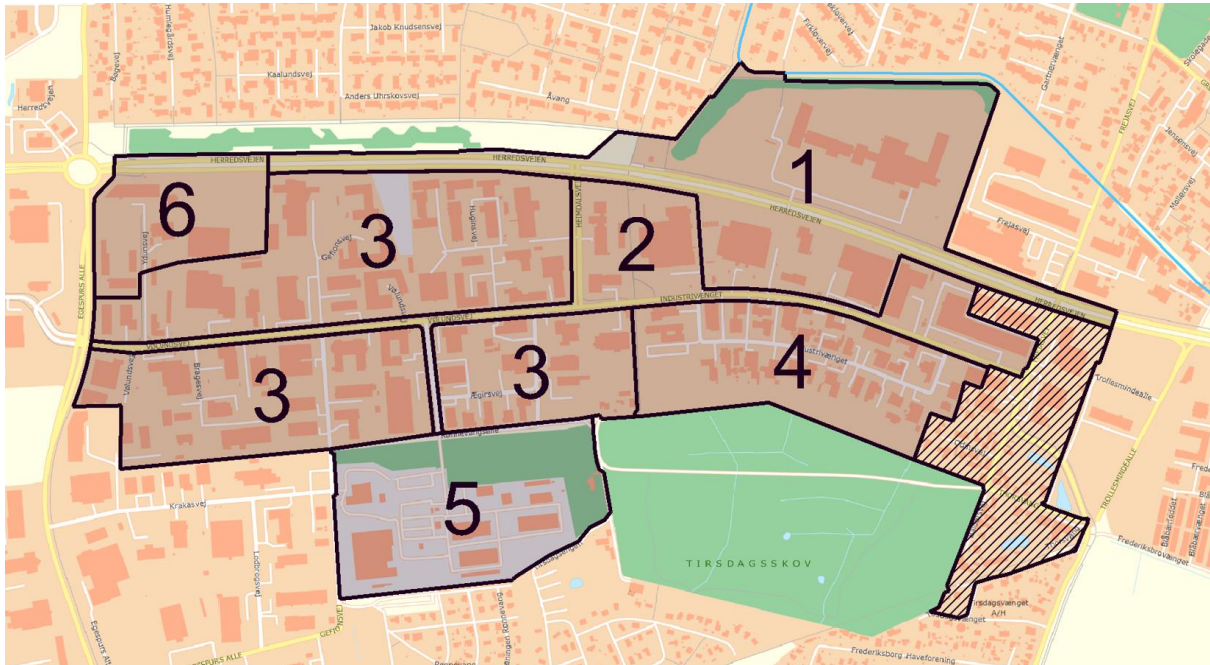

Figur: Delprojekter nr. 1-6 og områder der er dækket af disse. Stiplede områder: Anlægsarbejde er udført.

Delprojekt nr.	Projekt navn	Forventede anlægsperioder. <b>FORELØBIG.</b> Etapeopdeling og endelig fastlæggelse sker i den senere planlægning.
-	Etape 1.1. - Frejasvej mfl.	Udført. Ny regnvandsledning i Frejasvej og tilslutning af eksisterende regnvandsledninger - Odinsvej mfl.
1	RV - Bassin ved Åvang og ledninger (i Herredsvejen)	Medio/ult. 2022- medio/ult. 2023
2	RV - Industrivænget - Vølundsvej mfl.	Primo 2023- medio 2024
3	RV - Sideveje, Gefionsvej mfl.	Medio 2023 - ultimo 2024
4	RV - Industrivænget loopet	2024
5	RV - BKV- og Materielgrunden	Primo 2024 - medio 2025
6	RV - Ydunsvej	2023

Tabel: Oversigt over delprojekter og forventede anlægsperioder.

Sidst opdateret: november 2021.
